


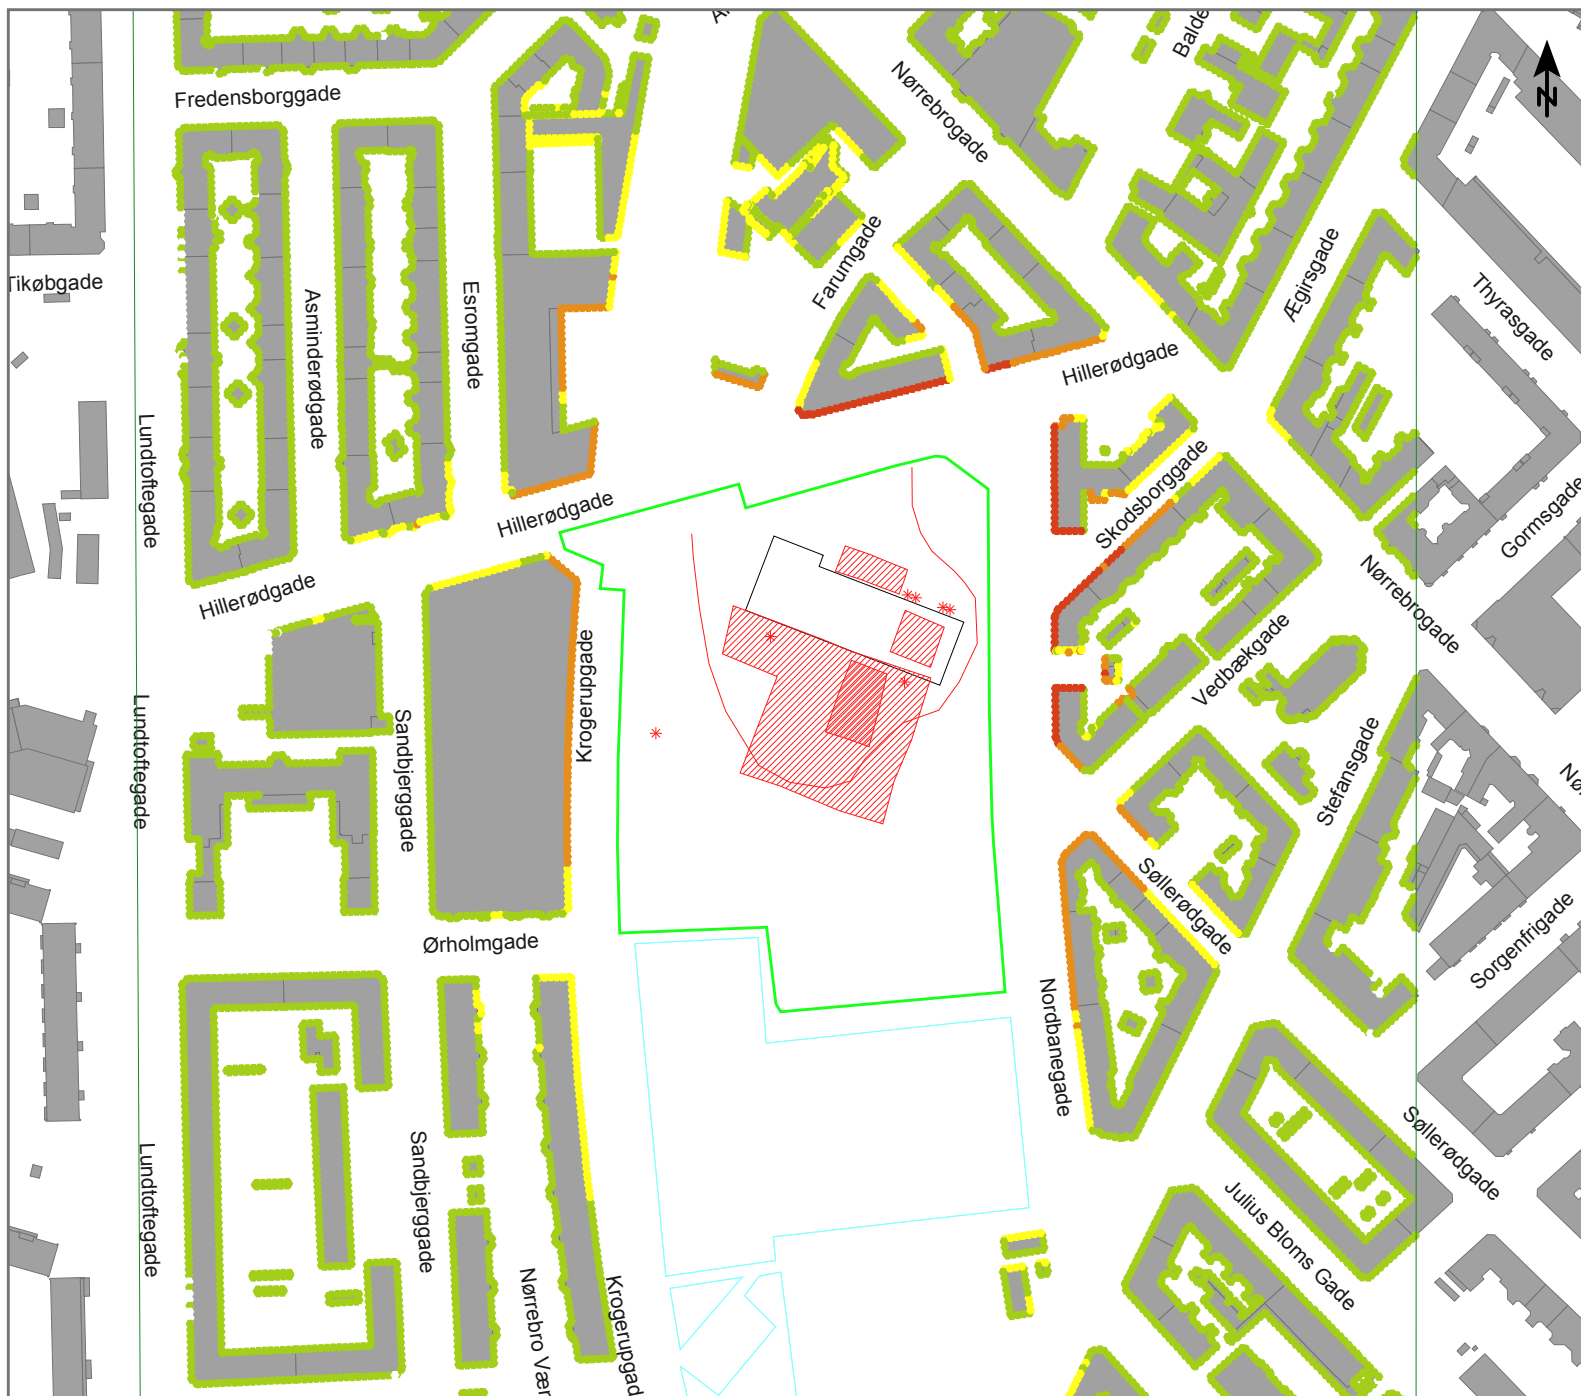

Anlægsarbejde på Nørrebro Parken (Nøp)

Støjdbredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Dag.

Scenario:

1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Betonpumpe, LWA = 107 dB
1x Betonbil (støbning), LWA = 97 dB
1x Betonbil (kørsel), LWA = 60,7 dB/m (4 pr. time)
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 95 dB

Højest belastede facade: 70 dB(A)

Målforhold 1 : 2500

0 12,5 25 50 75 100 m

Facadestøjniveau


L_{Aeq,1t} [dB(A)] - 7,5 m.o.t.

0 <=	< 55
55 <=	< 60
60 <=	< 65
65 <=	< 70
70 <=	< 75
75 <=	

Signaturer

Bygning
Støjskærm/Byggepladshegn
Kilde, punkt
Kilde, linie
Kilde, areal

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nøp.3-1 dag
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

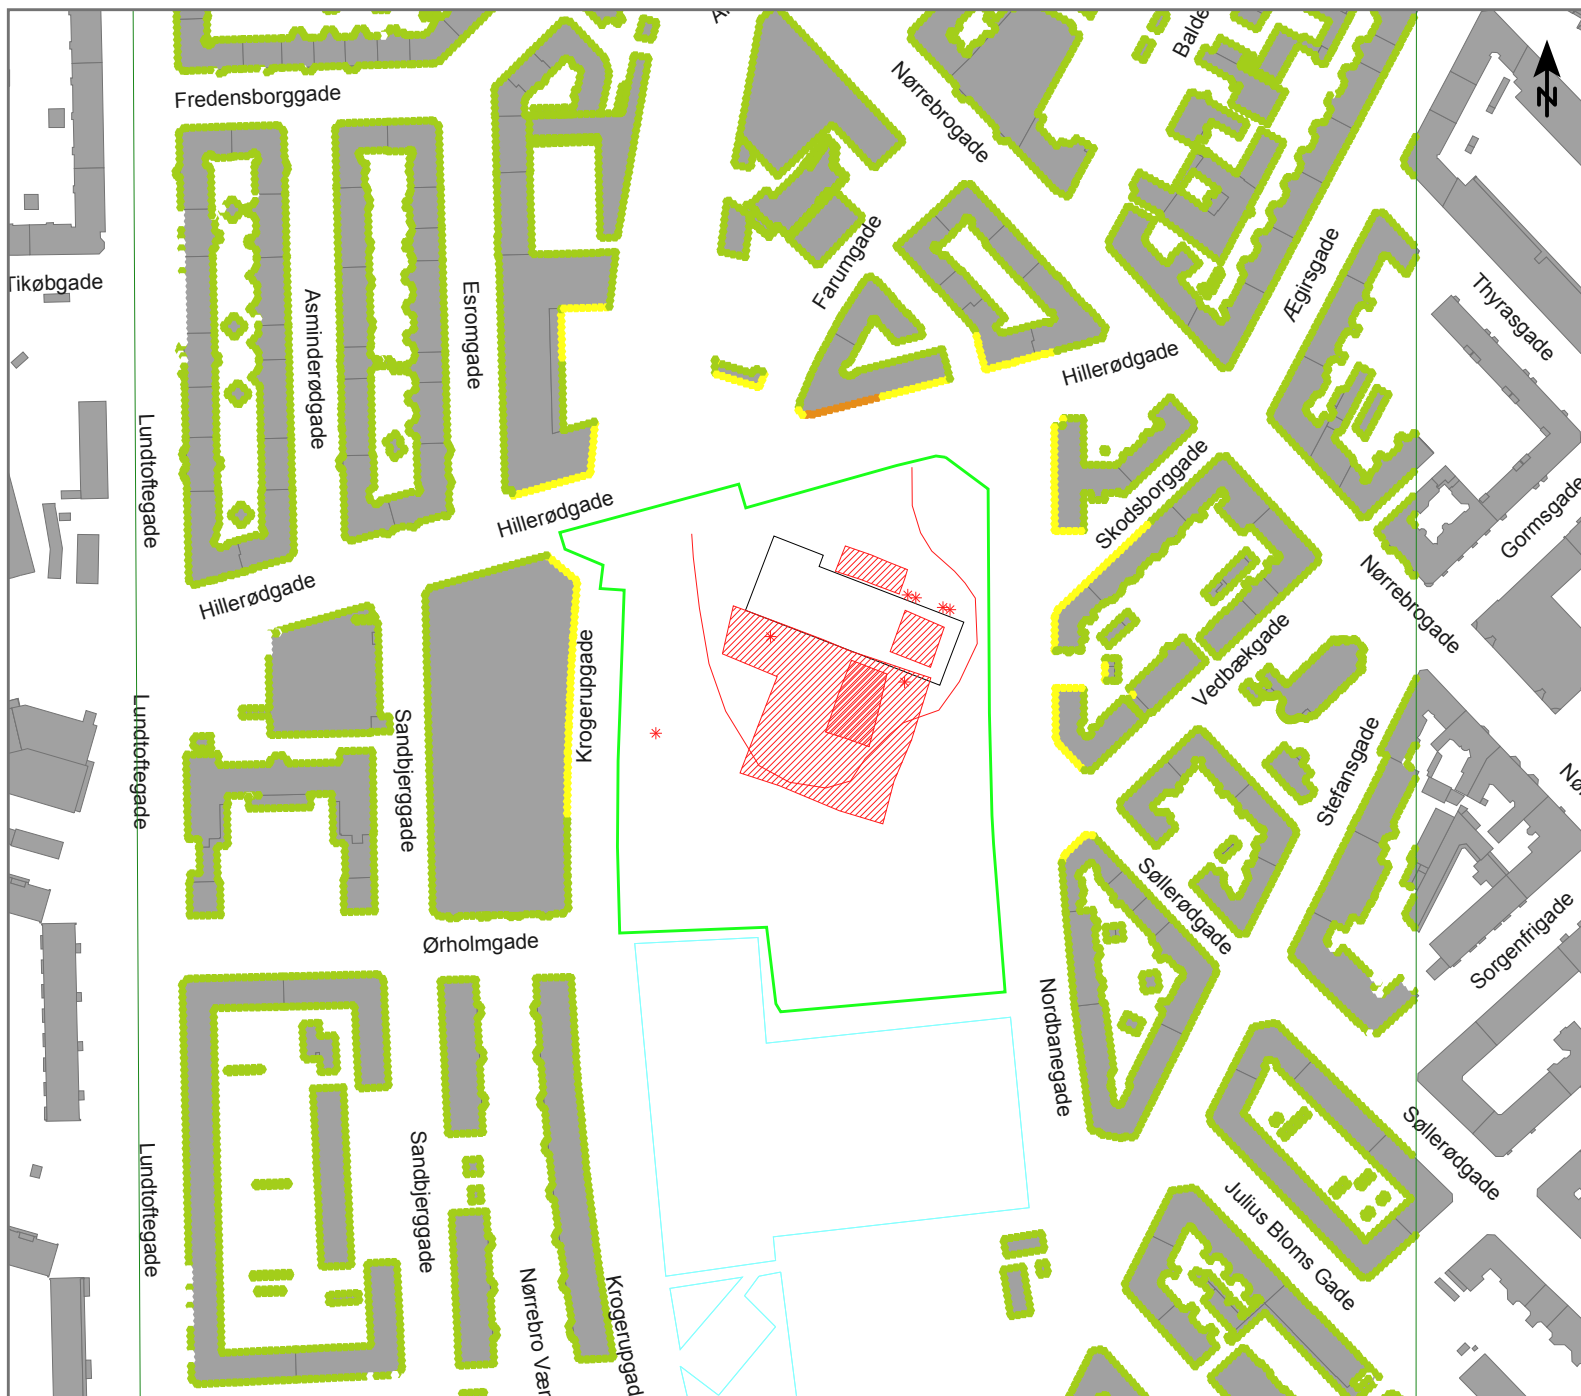

Anlægsarbejde på Nørrebroparken (Nøp)


Støjdbredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Aften.

Scenarie:

1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 95 dB


Højest belastede facade: 61 dB(A)

Målforhold 1 : 2500




Facadestøjniveau


L_{Aeq,1t} [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer



Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
: Bilag 001.Nøp.3-1 aften
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

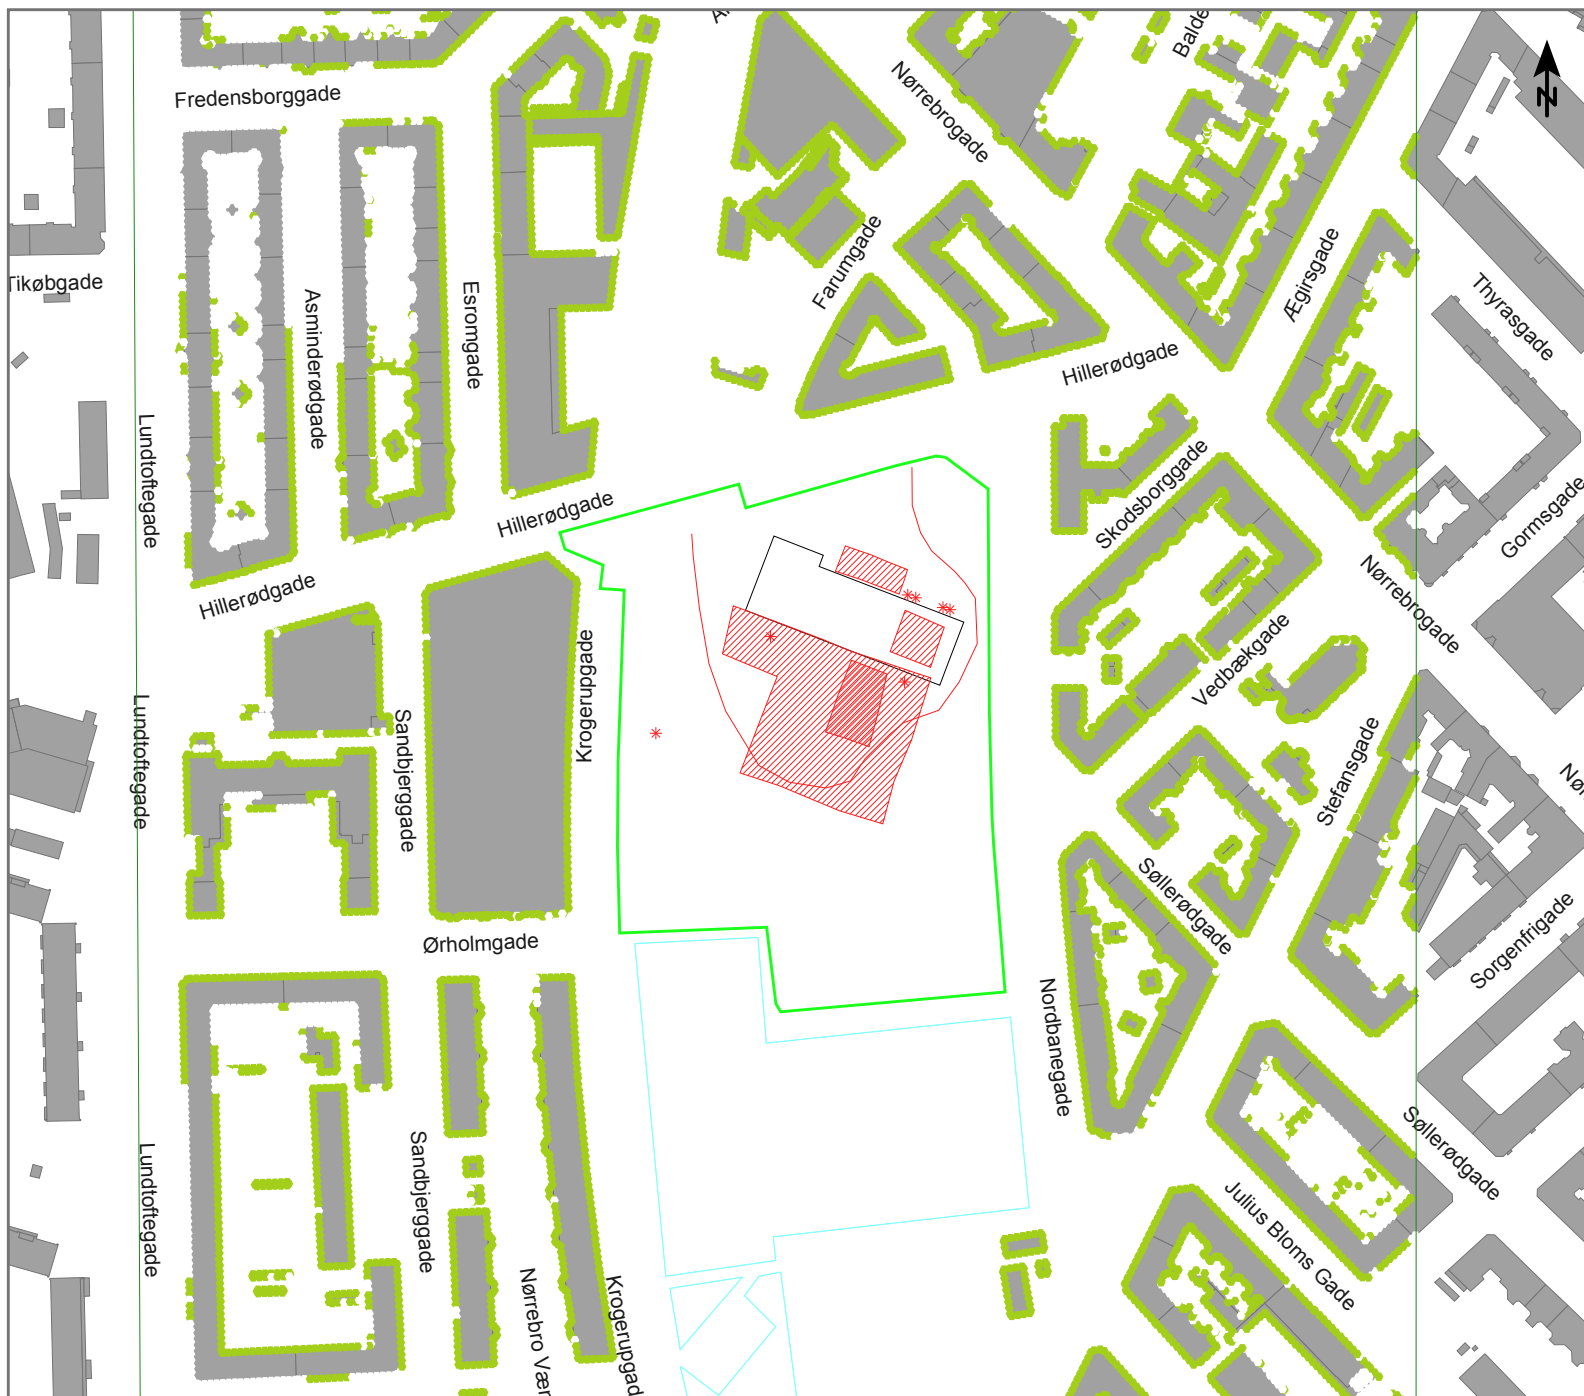

Anlægsarbejde på Nørrebro Parken (Nøp)

Støjdbredelse fra:
Fase 3-1. Støbning under topdæk. Nat.


Scenarie:
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
Håndværktøj, LWA = 85 dB (pr. hul)

Højest belastede facade: 46 dB(A)


Målforskel 1 : 2500



Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer



Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nøp.3-1 nat
Dato : 04.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA



Anlægsarbejde på Nørrebro Parken (Nøp)

Støjubbredelse fra:
Fase 3-2. Udgravning til udvendig trappe. Dag.


Scenarie:
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Gravemaskine, LWA = 106 dB
1x Jordkørsel, LWA = 60,7 dB/m (3 pr. time)

Højest belastede facade: 66 dB(A)


Målforshold 1 : 3500



Facadestøjniveau
LAeq [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer



Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nøp.3-2 dag
Dato : 01.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

Nørrebro Parken. Fase 3-2. Udgravning til udvendig trappe. Dag




Anlægsarbejde på Nørrebro Parken (Nøp)

Støjdbredelse fra:
Fase 3-3. Håndtering af muck og tunnelelementer. Nat.


Scenario:
3x Portalkran (muck)
2x Gaffeltruck
Kildestyrke for drift af ovenstående kilder,
LWA=101 dB baseret på overvågningsmålinger
1x Mørtelanlæg, LWA = 94 dB
1x Mucktog i hul, LWA = 100 dB (5 min per time)
1x Gravemaskine (lille), LWA = 100 dB
1x Ventilationsanlæg, LWA = 83 dB
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB

Højest belastede facade: 60 dB(A)

Målforhold 1 : 3500




Facadestøjniveau
LAeq, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
Bilag 001.Nøp.3-3 nat
Dato : 07.04.2014
Udført af : TSOL
Kontr. : JVM
Godk. : UVA

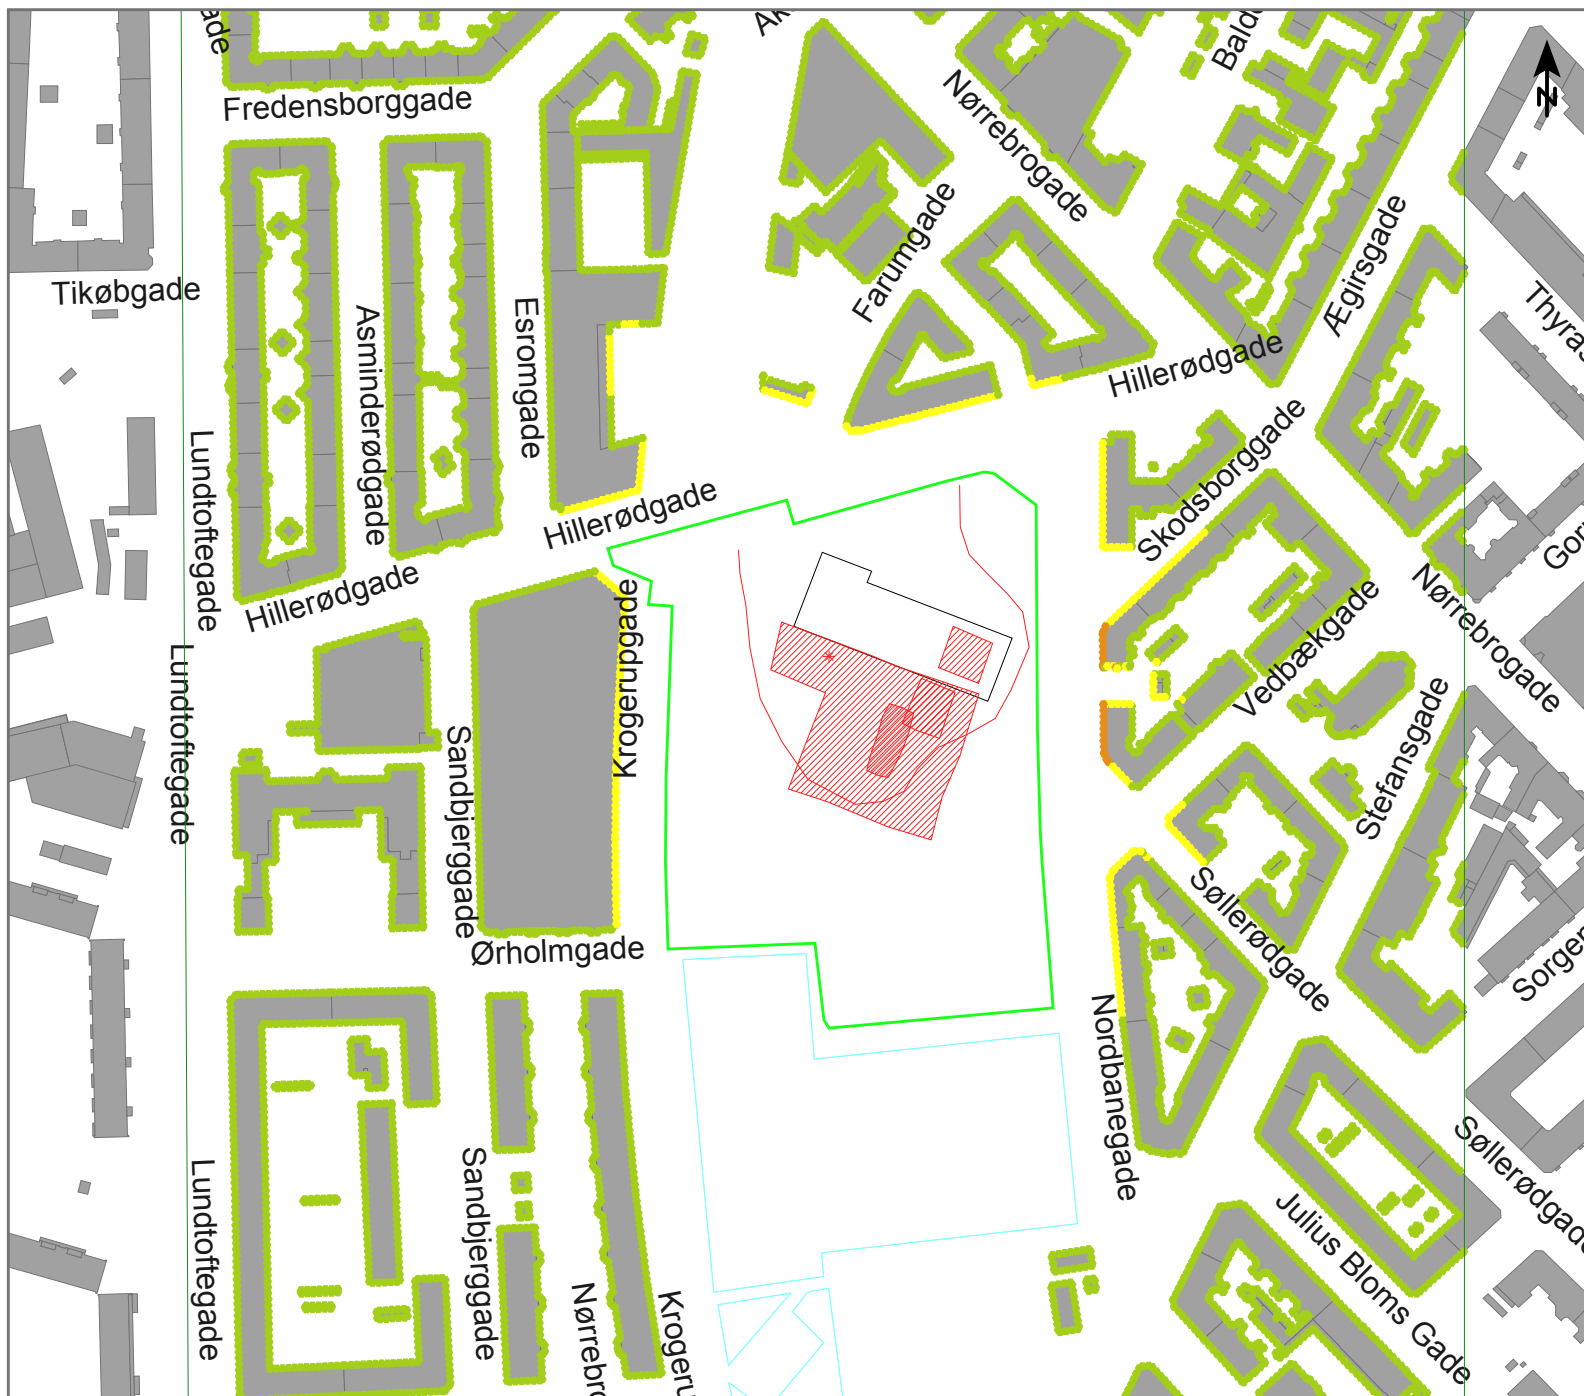

Anlægsarbejde på Nørrebroparken (Nøp)


Støjubbredelse fra:
Fase 4-1. Montering af elektriske og mekaniske
installationer i stationsboksen. Dag.

Scenarie:

1x Gaffeltruck, LWA = 102 dB
1x Tårnkran, LWA = 98 dB
1x Mobilkran, LWA = 100 dB
1x Lastbilkørsel, LWA = 60,7 dB/m (1 pr. time)
1x Håndværkstøj, LWA = 95 dB


Højest belastede facade: 61 dB(A)

Målforhold 1 : 2500




Facadestøjniveau

L_{Aeq}, 1t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer



Dok. nr. : MCW-3-COO-EIA-GEN-REP-001
: Bilag 001.Nøp.4-1 dag
Dato : N
Udført af : 07.04.2014
Kontr. : TSOL
Godk. : JVM
: UVA

