



Klient:
Metroselskabet I/S

Projekt:
Kk Anlægsarbejde transfer tunnel

Støjudbredelse fra:
Fase 1.1: Boringer, dag.


Scenarie:
1x Wassara Borerig/ sekant borerig e.l., LWA = 117 dB
1x Gravemaskine, LWA = 105 dB
1x Håndværktøj, LWA = 95 dB
1x Vandbehandlingsanlæg, LWA = 85 dB
1x Lastbilkørsel (4 stk. pr. time), LWA = 61 dB pr. m.

Højest belastede boligfacade: 77 dB(A)

Målforhold:



Facadestøjniveau
LAeq, 8t [dB(A)] - 7,5 m.o.t.

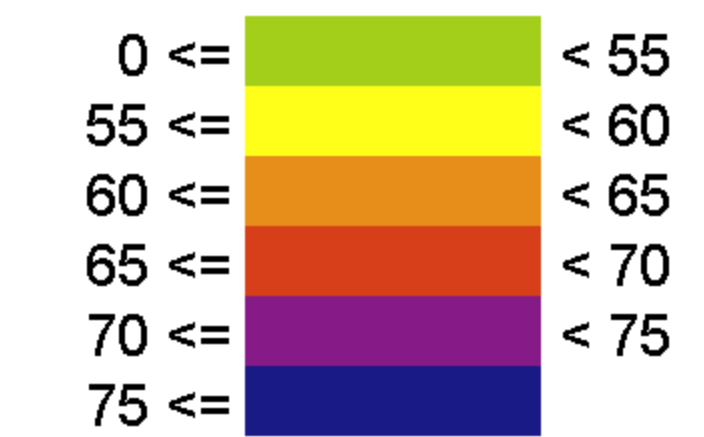

Signaturer

- Bygning
- Støjskærm/Byggepladshegn
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal

Dok. nr. : 1100
: Fase 1.1
Dato : 27.09.2018
Udført af : BRHM
Kontr. : JVM
Godk. : XXX
